


КАК СДЕЛАТЬ РЕМОНТ

без ошибок?

45 *этапов*
ремонта

01

Готовый проект –
всё ясно, что
и где. Вся
комплектация.

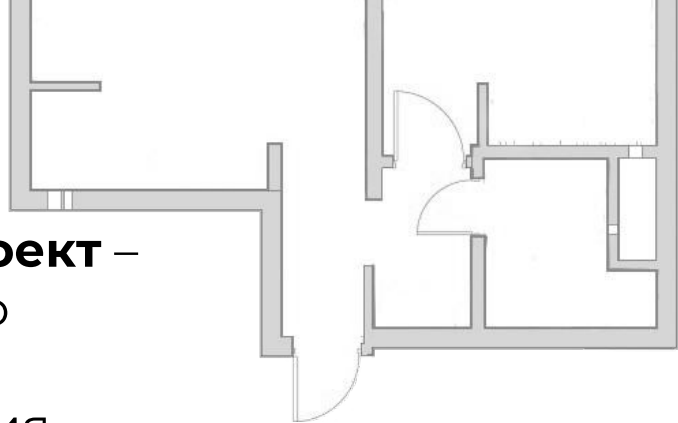

02

Объект готов для работ –
электричество, вода,
место для проживания.

03

Удаление стен
и перегородок

04

Подготовка балконов и
лоджий под остекление
(чтобы могли сделать
замеры)

05

**Замер входной
двери**



**Согласовать даты
включения
горячей
и холодной
воды**

06

WALL STREET

 viktorviden

07

Грунтование и окрашивание потолка

Решить **какая кухня** – уточнить
технические требования,
подготовить для монтажа

08



09 Возведение стен и перегородок

10

Выбрать, кто установит **кондиционер** – какие у них требования под конкретное оборудование



11

Гидроизоляция санузла
и выравнивание стен
(установка маяков)

12

**Гидроизоляция
остальных помещений**
(если требуется)

13

Все **полы обрабатываются
бетон-контактом** или другим
связующим грунтом – подготовка
для заливки стяжки

14

Устанавливается
входная дверь,
монтируются
все окна,
остекляются
балконы и
лоджии.

WALL STREET

viktorviden



Приглашаются специалисты

по кондиционерам (нарисовать трассы), специалисты по охране (то же самое), по видеонаблюдению, спутниковому телевидению, интернету и т.п. – получить рекомендации, какие кабели и как их необходимо проложить (надо всё включить в проект и поручить проложить тем электрикам, кто будет этим заниматься на объекте).

15

16

Армирование будущей стяжки пола, установка выравнивающих маяков, установка демпферной ленты и заливка самой стяжки (в санузлах – ниже)

17

После того как по полу можно ходить – **замена радиаторов отопления**

18

Приезд специалиста по кухням – точки вывода воды, электричества и тп – все эти требования вносятся в проект



19

Штробирование стен, черновая электрика, черновая сантехника (кабели, трубы, распаячные коробки) – то есть то, чего не будет видно.

20

Установка трасс кондиционеров, установка внешних блоков

21

Монтаж подогрева пола в санузлах

22

Монтаж всех слаботочных сетей (охрана, видео, интернет)

23

Возведение фальшстен (чтобы скрыть коммуникации, провода и т.п.)

Установка потолочных коробов и закладных для шкафов-купе и другой встроенной мебели



24

WALL STREET

 viktorviden

25

**Грунтование стен, установка
малярных уголков, шпаклевание
стен, ошкуривание стен,
повторное грунтование,
повторное шпаклевание,
повторное ошкуривание**

Выезд **замерщика по натяжным
потолкам**

26

27

**Отделка лоджии и
установка всех узлов
примыкания**

(раньше нельзя, потому
что подготовка стен –
пыльная работа и отделка
лоджии придет
в негодность).

28

**Установка
ванны в ванной
комнате,
установка
унитаза**

(подготовка), **облицовка
ванной плиткой**



29

**Очищение стяжки пола,
грунтовка, слой
самовыравнивающейся смеси
(тонкий слой)**

WALL STREET

 viktorviden

**Установка
подоконников,
столешниц, затирка
швов плитки**

31

Грязные работы завершены



WALL STREET
wallstreetstudio.ru

32

Стены еще
грунтуются,
**обои
клеятся**

и окрашиваются
при необходимости.

Установка
**натяжных
потолков**

33

34

Укладка
**напольного
покрытия**

35

Установка
дверей

36

Установка
**откосов
входной двери**

Установка кухни
и корпусной
мебели

37

WALL STREET

viktorviden

38 **Плинтуса**, установка чистовой электрики, внутренние кондиционеры

39 **Установка чистовой сантехники** (унитаза, потому что никто не любит, когда в их унитаз ходит кто-то кроме заказчика)

Генеральная уборка
и нанесение
декоративного
герметика

40

41 **Полки, шторы, жалюзи**

42

Доставка и сборка
мебели



43 **Настройка видео, интернета, телевидения**

Декор

Установка
сейфов

44

45

WALL STREET

 viktorviden

ГОТОВЫ

преобразить

СВОЕ ПРОСТРАНСТВО?

**ЗАПИСАТЬСЯ НА БЕСПЛАТНУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ**

wallstreetstudio.ru
